


PŘECHODNÉ DZ
- I. ETAPA - A

VARIANTA - 2

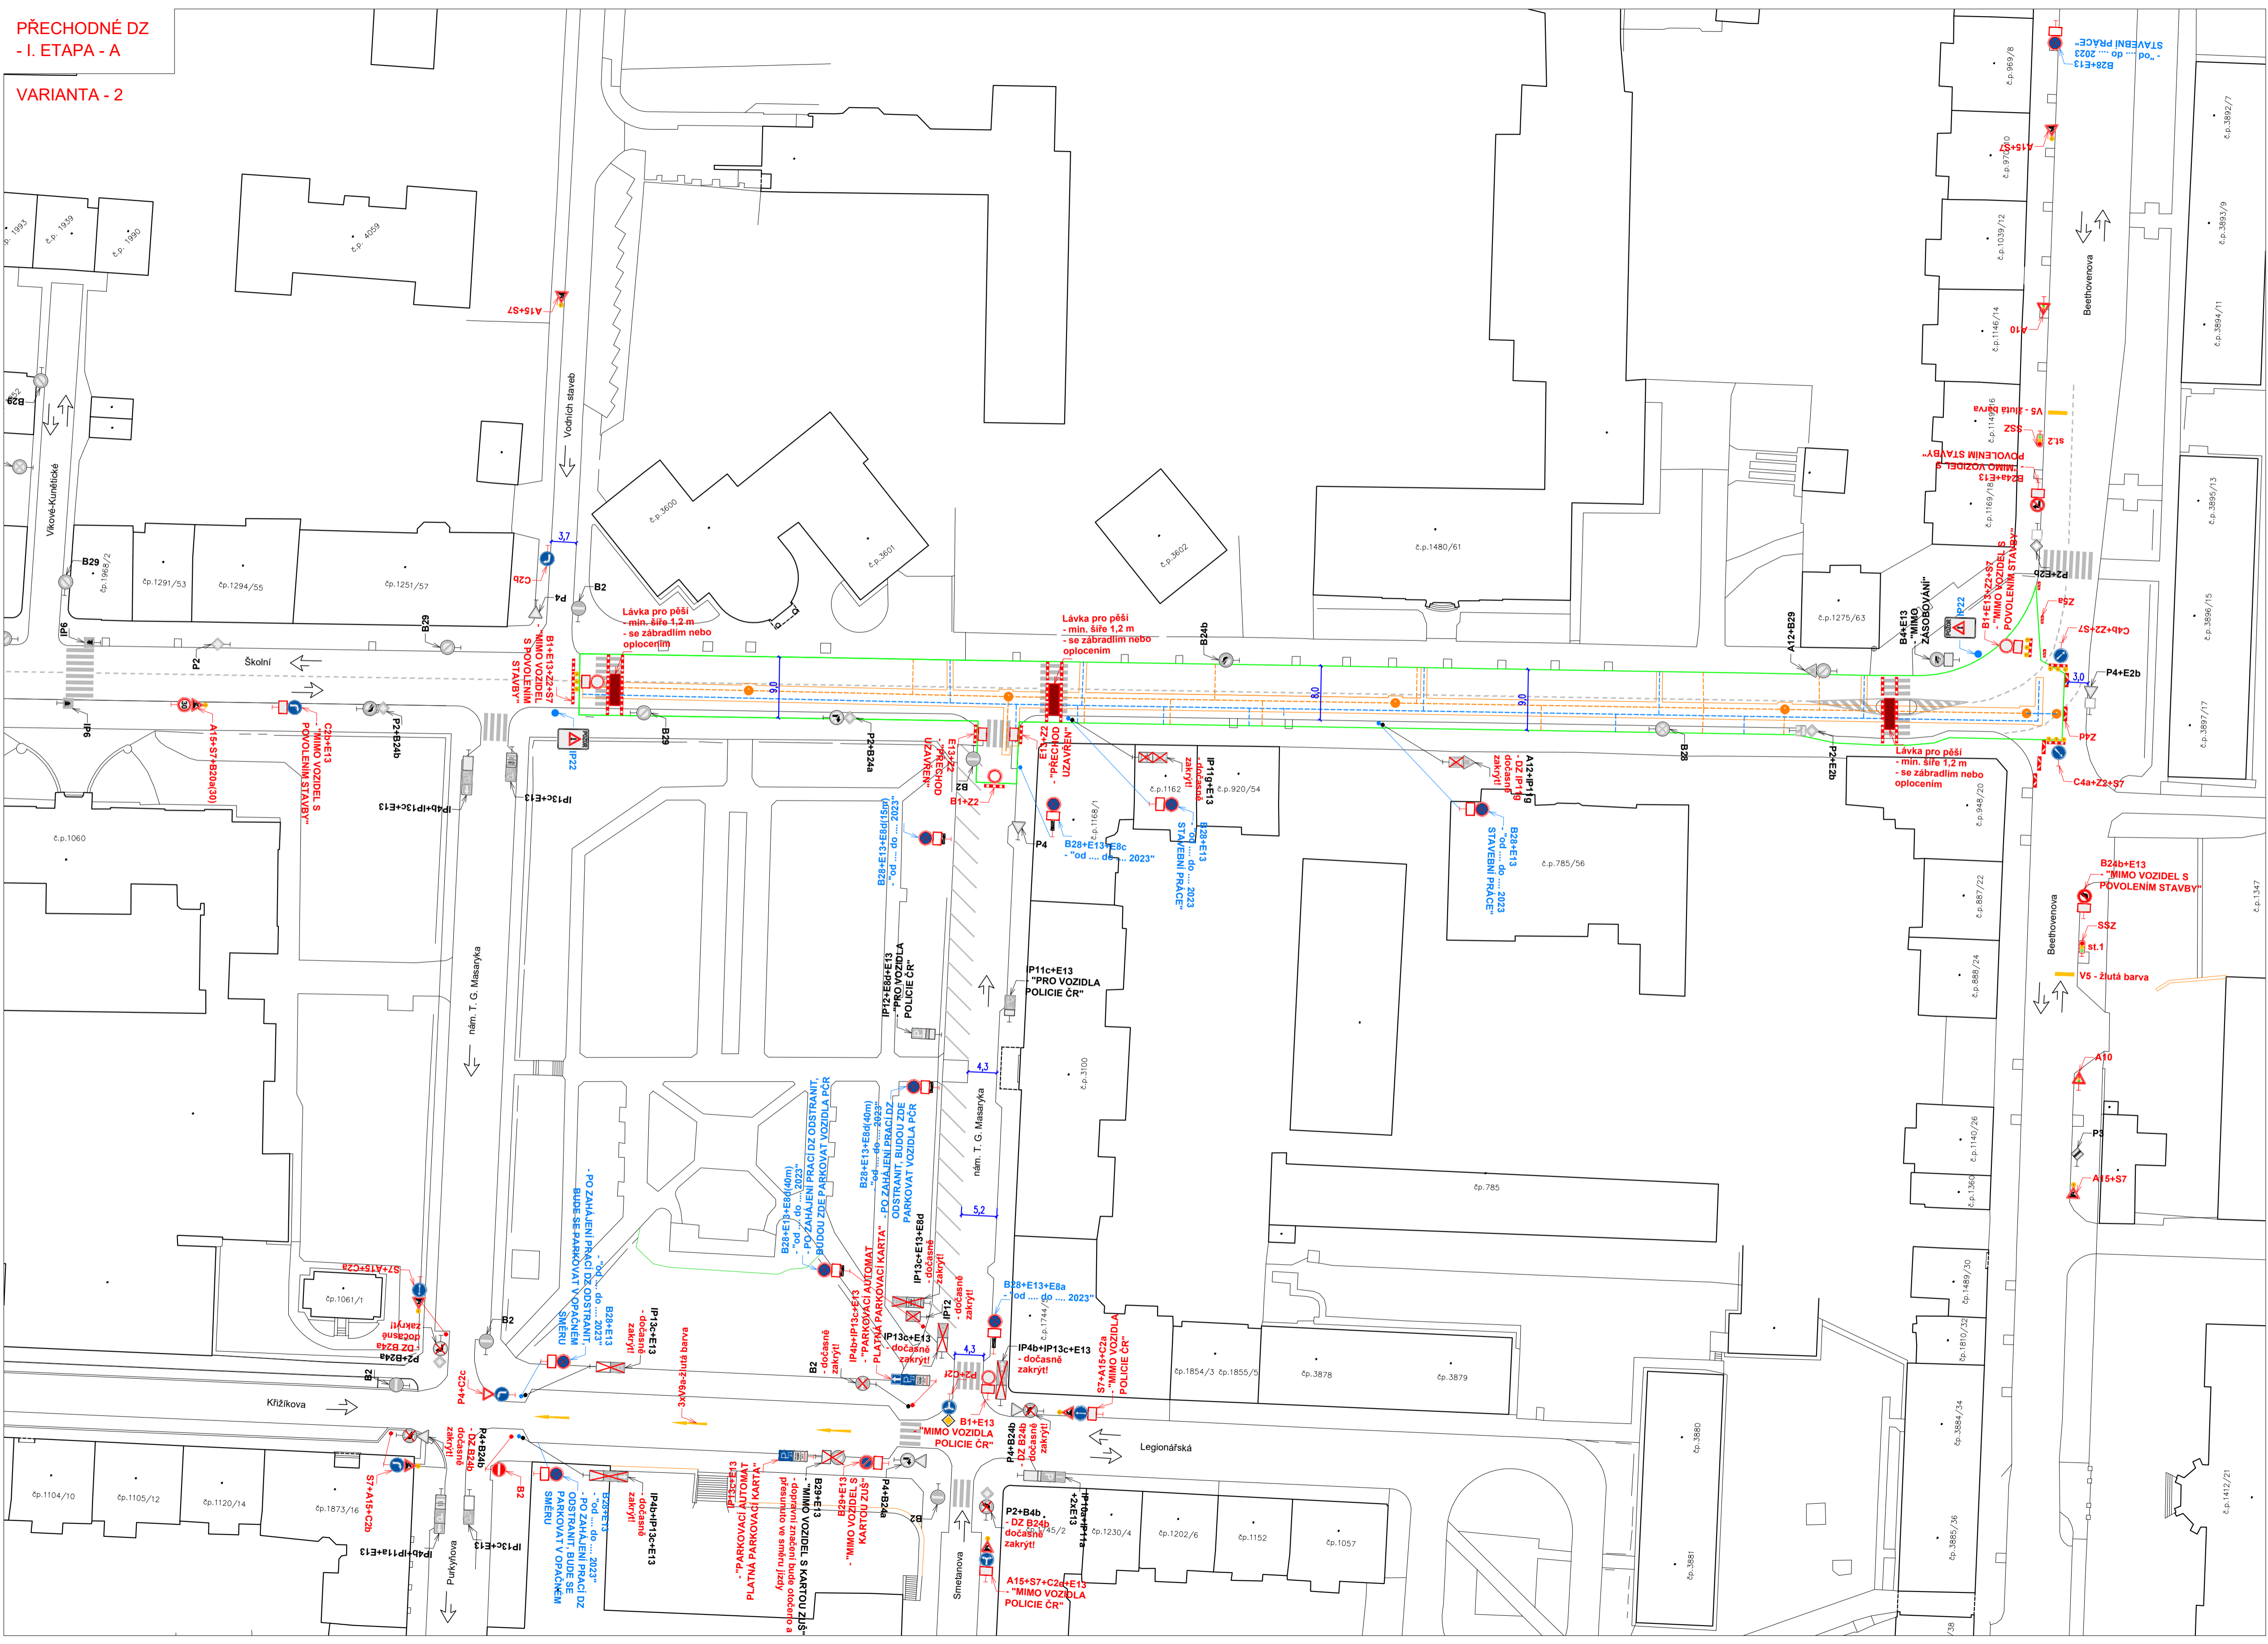

- Stávající polohopis
- Kanalizační stoka vč. přípojek
- Vodovodní potrubí vč. přípojek
- Stávající dopravní značení
- Přechodné dopravní značení
- Přechodné dopravní značení
- Oplocení
- Vstupy do budov
- Přejezdový plech pro vozidla min. šíře 3,0m
- Označená a poučená osoba pro regulaci a řízení provozu
- Trasa pro chodce
- Stávající směry provozu vozidel

Poznámky:

- Jakékoli nesrovnalosti konzultovat s projektantem!!!
- Veškerá pracovní místa na komunikaci budou označena die TP 66, případně TP 65 a TP 133!!!
- Prostor zvláštního užívání bude zhotovitelem oplocen!
- Signální plán semaforů bude v průběhu stavby v případě potřeby upraven!

Mobilní semafor

Základní režim nastavení semaforů			
Typ instalace	Popis použití	Zelená ve fázi 1	Zelená ve fázi 2
2 fáze	v ul. Beethovenova st.1 zelená, st. 2 čeká	st. 1	
	v ul. Beethovenova st. 2 zelená, st. 1 čeká		st. 2

- Konkrétní signální plán vč. časů jednotlivých fází bude proveden odbornou firmou zajišťující osazení světelného signalizačního zařízení!
- Signální plán bude nastaven dle plánu SSZ v křižovatce ul. Palackého, Riegrova, Pražská, Beethovenova a bude v logickém souladu se signálním plánem této křižovatky!!!
- První den od osazení SSZ bude probíhat zkušební provoz, kdy budou popřípadě jednotlivé fáze a jejich časy upravovány dle konkrétních potřeb v křižovatce!
- SSZ bude umístěno tak, aby nebránilo volnému průchodu, neomezovalo rozhled v křižovatkách, neomezovalo rozhledy na/pro chodce a nezakrývalo DZI!

- Po zásypu výkopu a jeho ztuhnutí, budou komunikace udržovány, do doby provedení finální úpravy povrchu, v provizorním a provozuschopném stavu.

- Veškeré dopravní značení bude pravidelně kontrolováno!!!
- DZ bude udržováno v čistém (čitelném) stavu a bude kontrolováno správné umístění a nasměrování DZI!!!
- DZ bude umístěno tak, aby nebránilo volnému průchodu, neomezovalo rozhled v křižovatkách, nebránilo volnému přístupu do domů a nezakrývalo DZI!
- Uživatelům sousedních nemovitostí bude umožněn přístup k nemovitostem. Žadatel zajistí dostatečným a prokazatelným způsobem informovanost všech občanů dotčených zvláštním užíváním, rovněž bude dohodnut režim přístupu k jednotlivým nemovitostem v úseku stavby.
- Ve dnech svozů komunálního odpadu žadatel umožní odvoz komunálního odpadu nebo zajistí umístění odpadních nádob na místo jejich svozu po dohodě se svozovou firmou.
- Stavební práce v chodníku budou prováděny tak, aby byl vždy jeden chodník průchozí bez omezení!!!
- Po celou dobu stavebních prací bude vždy zajištěn rozhled na chodce na přechodech!!!



- V místě bude osazeno dopravní značení IP 22 s textem "OD ... 2023 DO ... 2023 REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU ULICE ŠKOLNÍ UZAVŘENA"
- + bude na DZ doplněna mapa s vyznačenou uzavírkou!
- DZ IP 22 bude osazeno v min. týdenním předstihu!
- Veškeré DZ bude umístěno na chodníku tak, aby nebránilo volnému průchodu, neomezovalo rozhled v křižovatkách, nebránilo volnému přístupu do domů a nezakrývalo DZI!

