

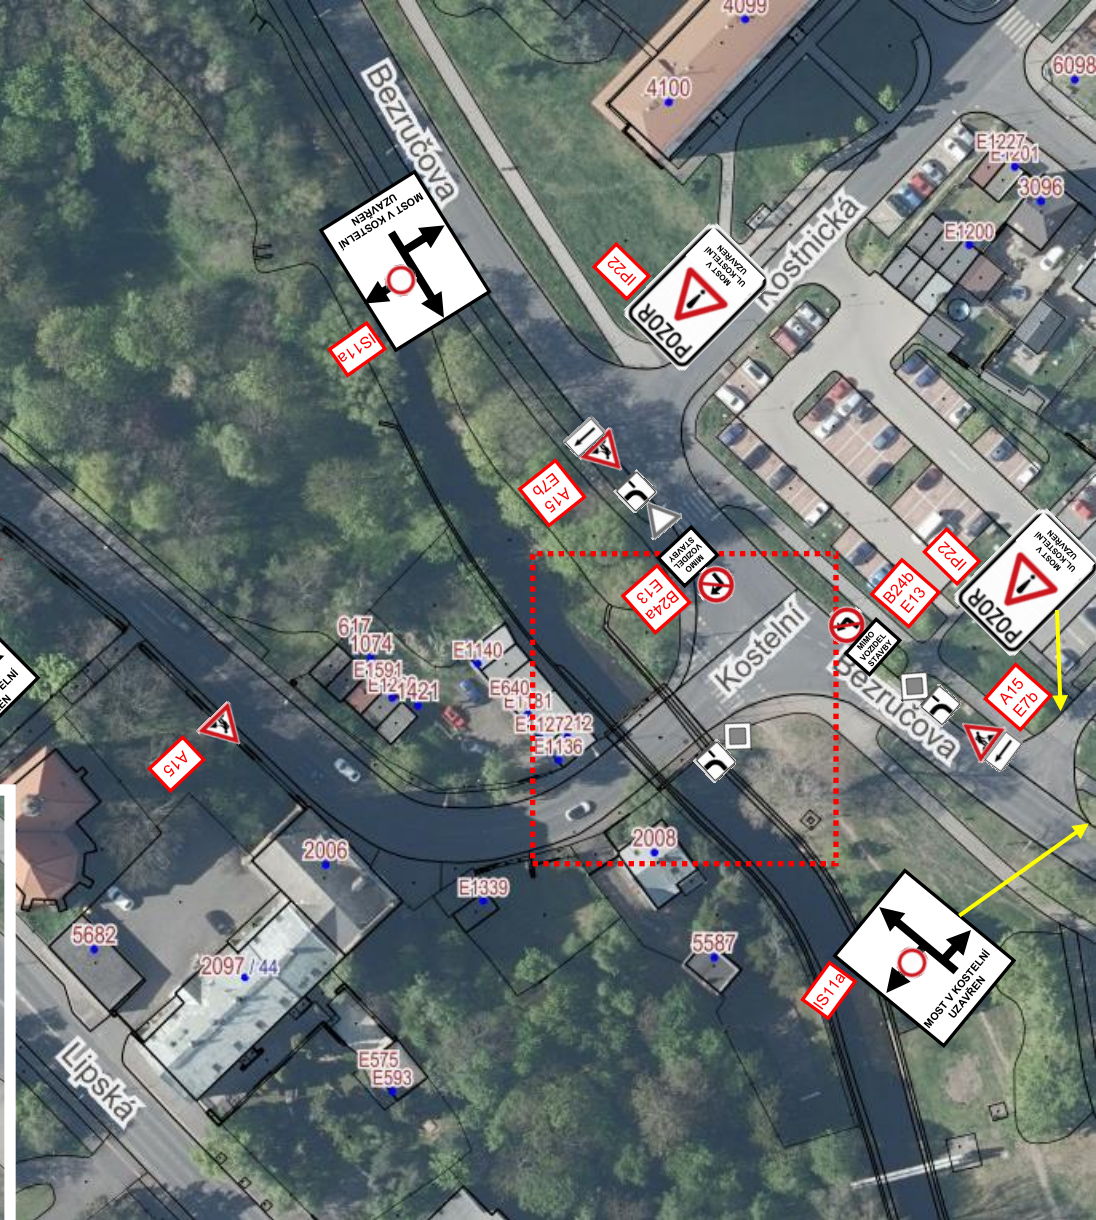


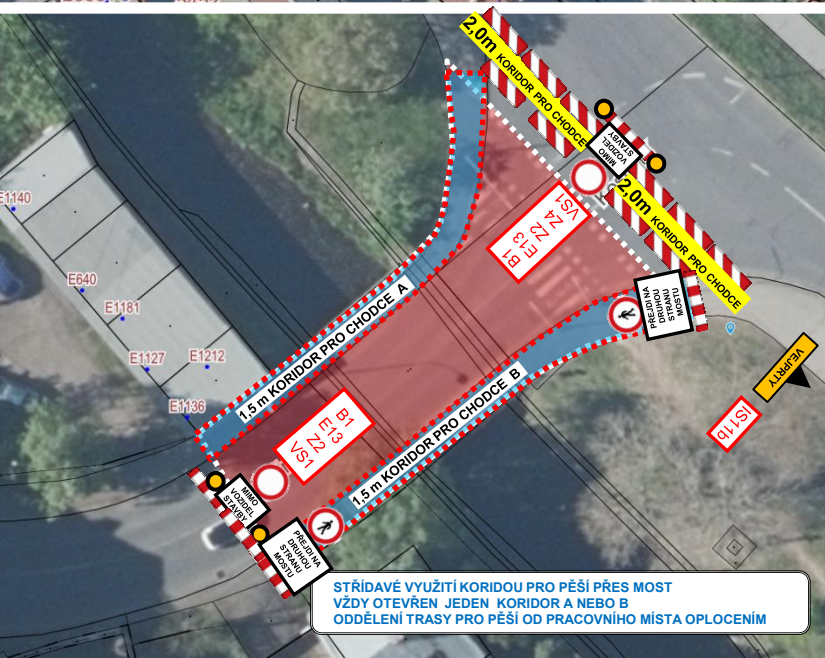


PO DOBU UZAVÍRKY DOČASNĚ ZNEPLATNIT DZ IS3d
3x IS3d NA UL.BEZRUČOVA
2x IS3c NA UL. LIPSKÁ

DIO MOST

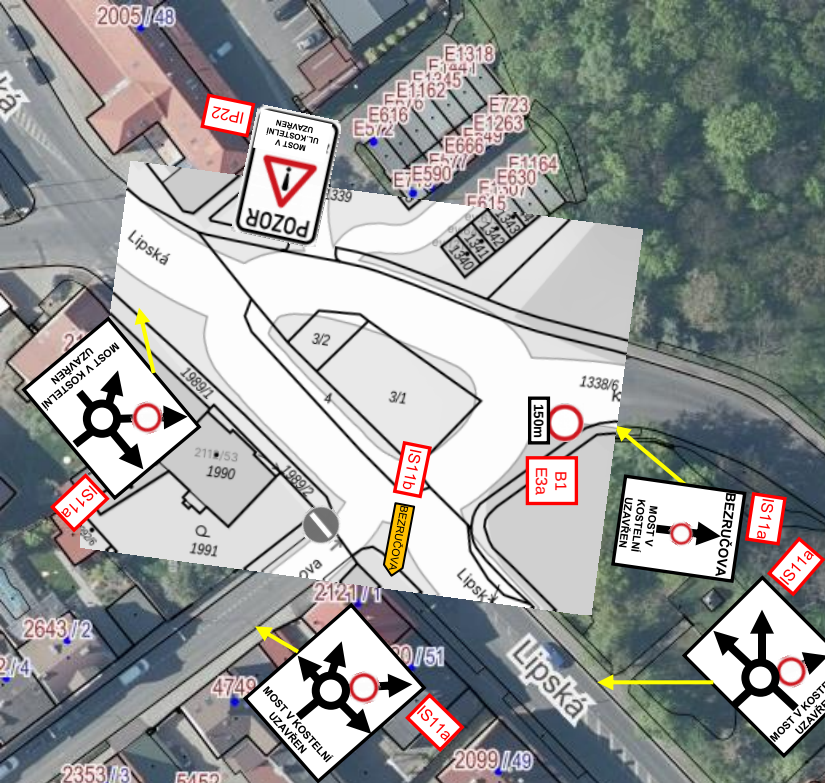

OBJÍZDNÁ TRASA

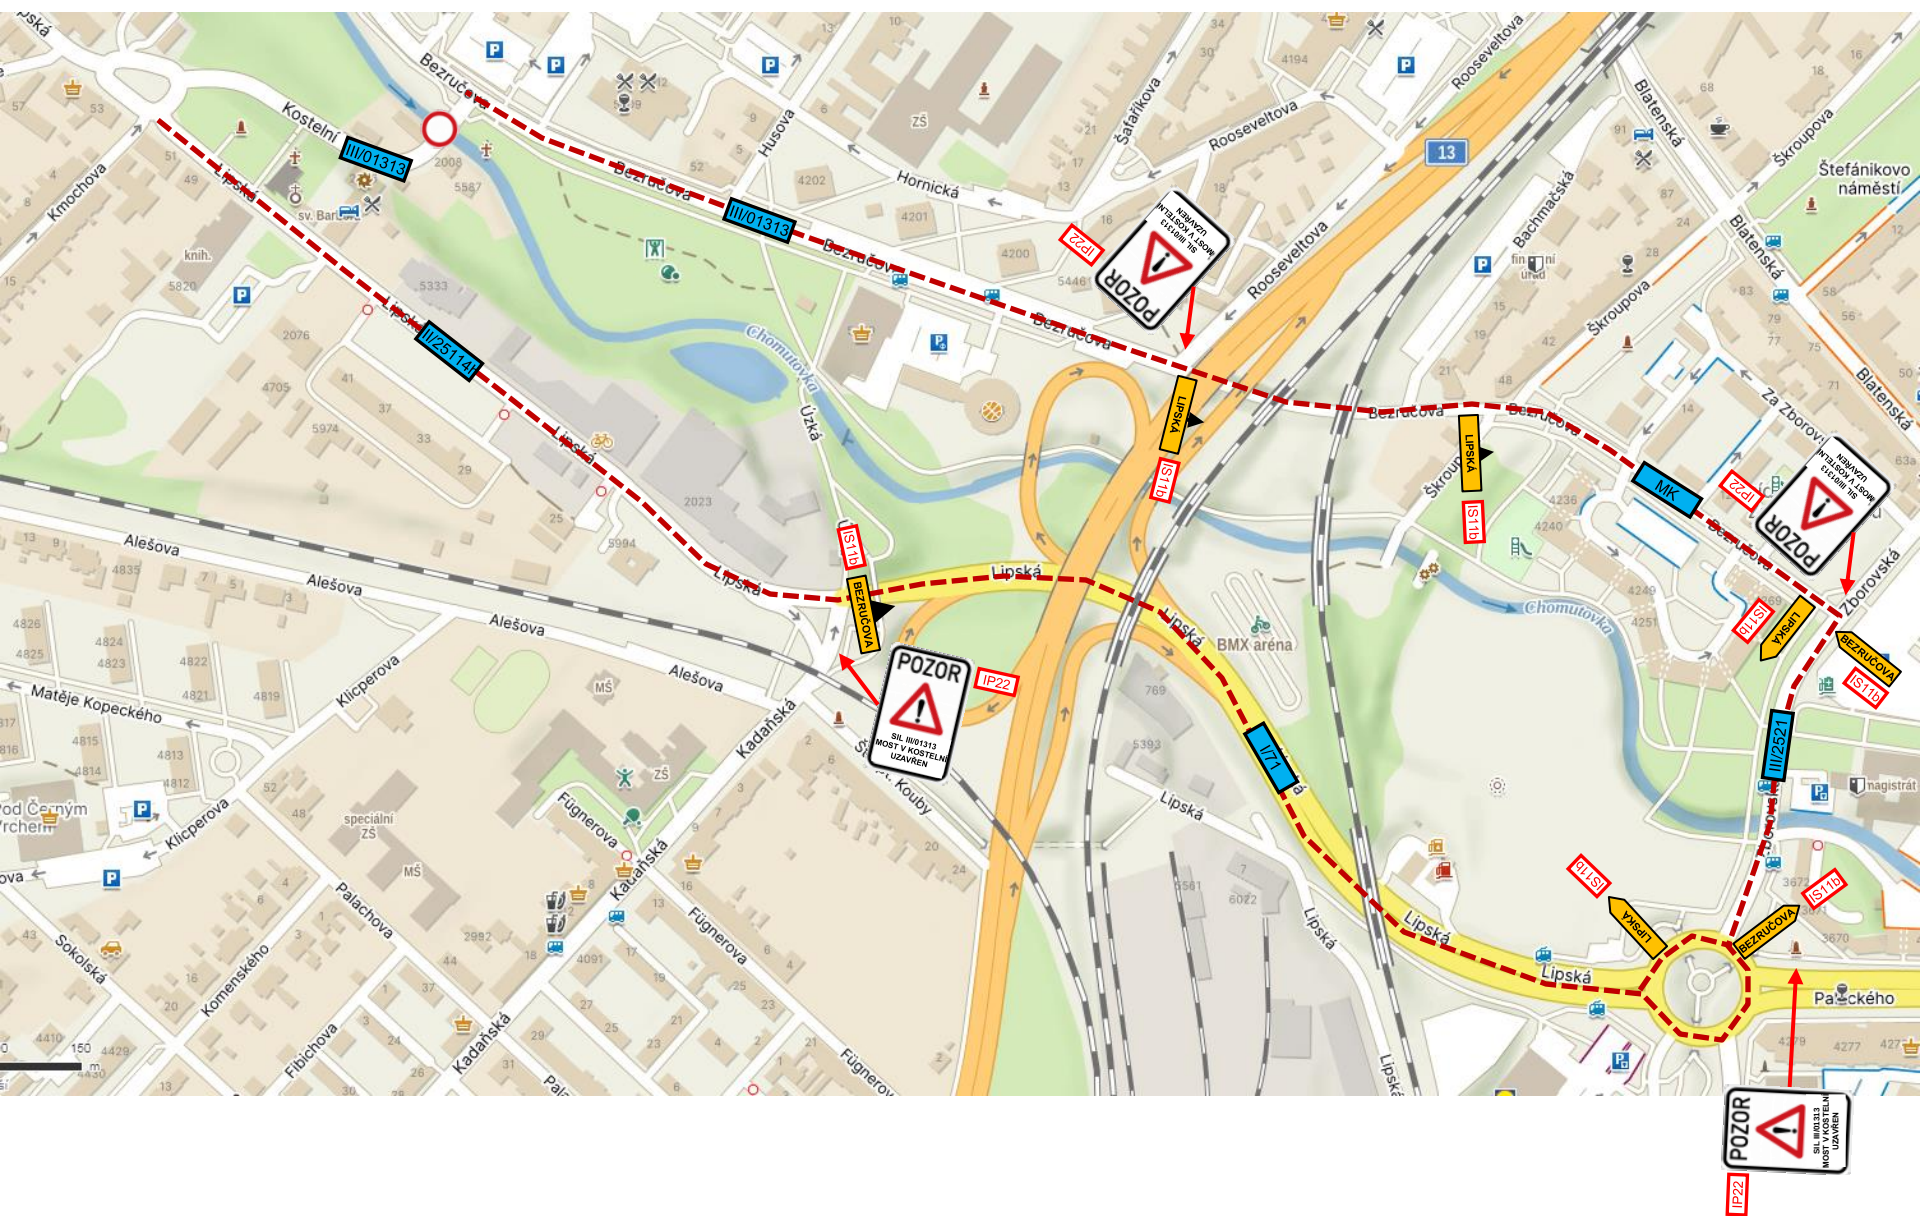

Zpráva k realizaci dopravních opatření pro provedení stavby

Zhotovitel : VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 25021851
Kontaktní osoba p. Rudolf Procházka 731 470 980

Silnice č.: III/01313 Kostelní u křižovatky s ul. Bezručova
Místo : Chomutov

Termín, rozsah a důvod :
19.5.2025 – 24.8.2025
Oprava mostu ev.č. 01313-1 Chomutov

Úplná uzavírka – zachování pohybu chodců po celou dobu stavby vždy po jednom z chodníků

Objízdná trasa

V obou směrech III/01313 Bezručova – MK Bezručova – III/2521 Zborovská – OK – I/71
Lipská – III/25114h Lipská – OK

Rozsah opatření

Oprava stávajícího mostu ev. č. 01313-1 přes řeku Chomutovka v obci Chomutov bude realizována za úplné uzavírky silniční komunikace. Bude zachován pohyb chodců vždy alespoň po jednom z chodníků. Dojde k odstranění stávajících asfaltových povrchů. Dále dojde k odstranění konstrukčních vrstev komunikace v místě přechodové oblasti mostu v rozsahu aby bylo možné přetažení izolace NK. V jízdním pruhu dojde k odbourání vyrovnávací desky nosné konstrukce která bude nahrazena novou. Nová deska bude proměnné tloušťky přibližně 5 – 20 cm a bude vyztužena KARI sítí minimálně 6/150x6/150. Deska bude k nosné konstrukci kotvena pomocí trnů z betonářské výztuže vlepených do vrtaných otvorů. Vyrovnávací deska mostovky bude opatřena hydroizolací z natavovaných pásů z modifikovaného asfaltu. Následně dojde k vyplnění přechodové oblasti mezerovitým betonem do výšky komunikace. Poté dojde betonáži římsy a osazení kamenného obrubníku. Po betonáži římsy bude namontováno zábradlí. Poté dojde k pokládce asfaltových vrstev komunikace na mostu a v přechodové oblasti. V souběhu s výše uvedenými pracemi proběhne realizace sanace spodní části stavby.

V Děčíně

dne 25.4.2025
