


PŘECHODNÉ DZ
- III. ETAPA
ul. Školní - křižovatka Vršovců/Meisnerova

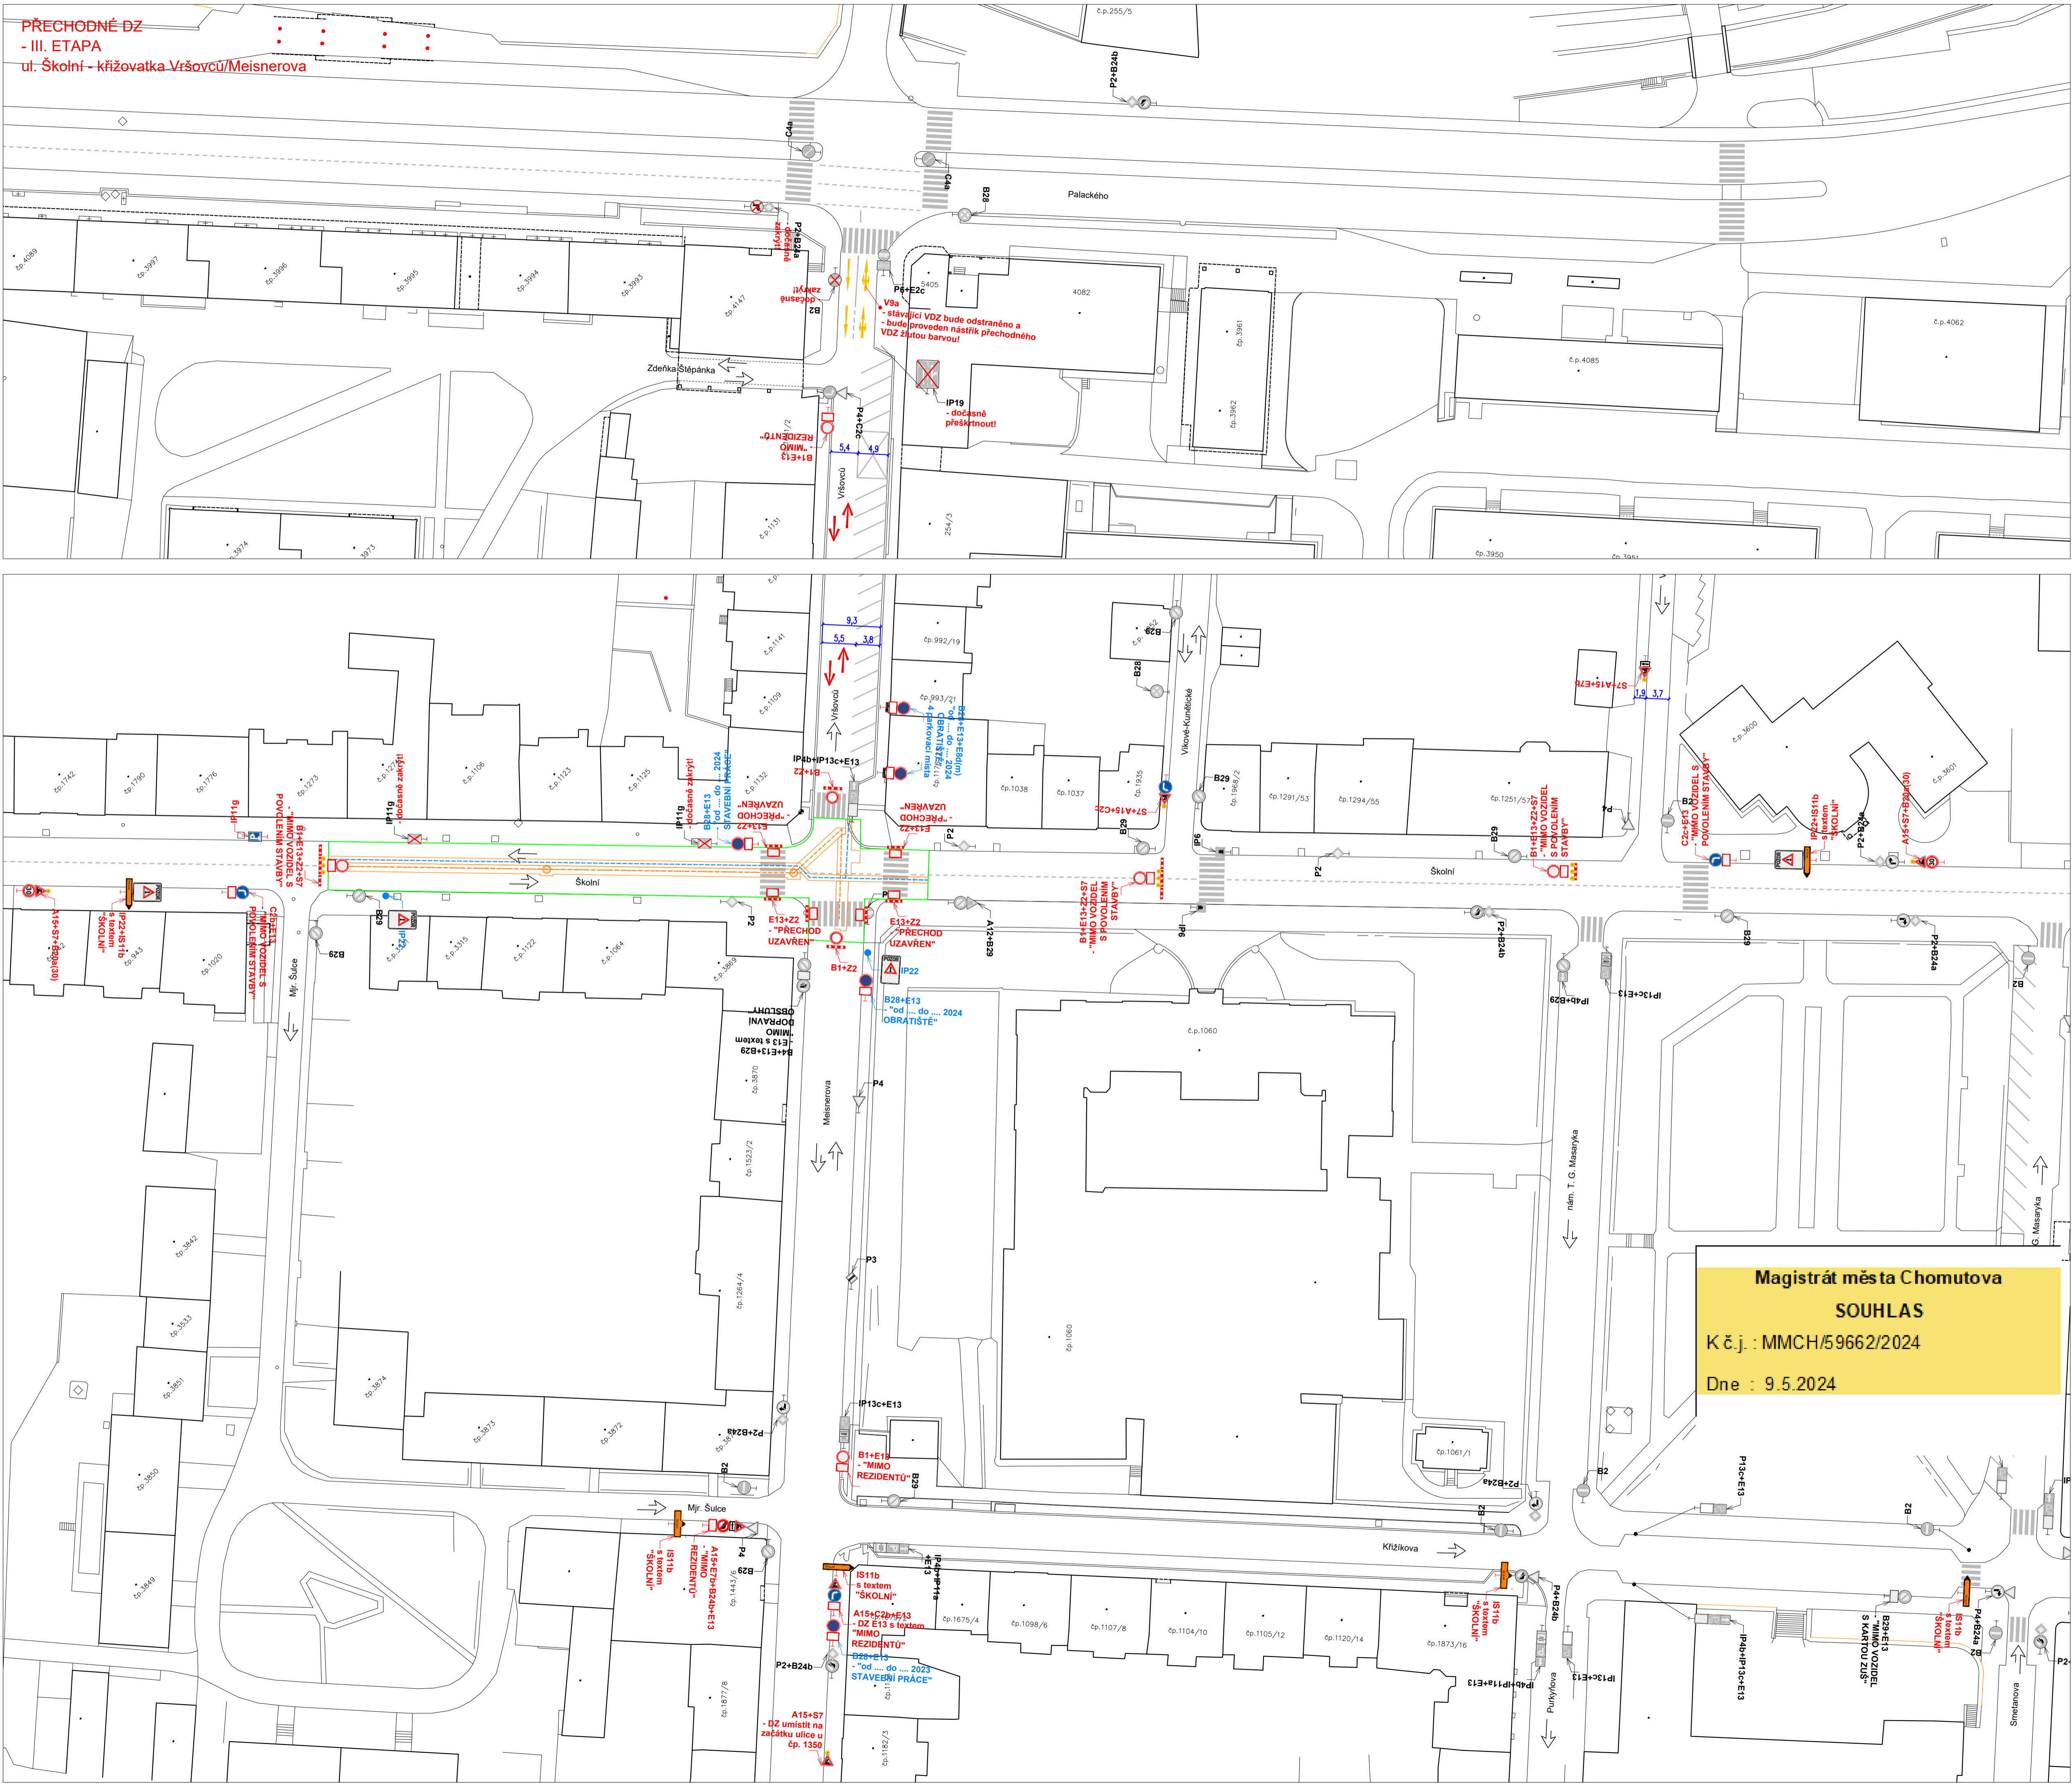

- V místě bude osazeno dopravní značení IP 22 s textem "OD ... 2023 DO ... 2023 REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU ULICE ŠKOLNÍ UZAVŘENA"
+ bude na DZ doplněna mapa s vyznačenou uzavírkou
- DZ IP 22 bude osazeno v min. týdenním předstihu
- Veškeré DZ bude umístěno na chodníku tak, aby nebránilo volnému průchodu, neomezovalo rozhled v křižovatkách, nebránilo volnému přístupu do domů a nezakrývalo DZ!

- Legenda obrisy, hranice:**
- Stávající polohopis
 - Kanalizační stoka vč. přípojek
 - Vodovodní potrubí vč. přípojek
 - IP19 Stávající dopravní značení
 - A15 Přejížděcí dopravní značení
 - B28 Přejížděcí dopravní značení osazené v min. týdenním předstihu
 - Oplocení
 - Vstupy do budov
 - Přejezdový plech pro vozidla min. šíře 3,0m
 - Označená a poučená osoba pro regulaci a řízení provozu
 - Trasa pro chodce
 - Stávající směry provozu vozidel

Poznámky:

- Jakékoli nesrovnalosti konzultovat s projektantem!!!
- Veškerá pracovní místa na komunikaci budou označena dle TP 66, případně TP 65 a TP 133!!!
- Prostor zvláštního užívání bude zhotovitelem oplocení!
- Signální plán semaforů bude v průběhu stavby v případě potřeby upraven!

Magistrát města Chomutova
SOUHLAS
K č.j. : MMCH/59662/2024
Dne : 9.5.2024

- Po zápsu výkopu a jeho ztuhnutí, budou komunikace udržovány, do doby provedení finální úpravy povrchu, v provizorním a provozuschopném stavu.

- Veškeré dopravní značení bude pravidelně kontrolováno!!!
- DZ bude udržováno v čistém (čitelném) stavu a bude kontrolováno správné umístění a nasměrování DZ!!!
- DZ bude umístěno tak, aby nebránilo volnému průchodu, neomezovalo rozhled v křižovatkách, nebránilo volnému přístupu do domů a nezakrývalo DZ!
- Uživatelům sousedních nemovitostí bude umožněn přístup k nemovitostem. Žadatel zajistí dostatečným a prokazatelným způsobem informovanost všech občanů dotčených zvláštním užíváním, rovněž bude dohodnut režim přístupu k jednotlivým nemovitostem v úseku stavby.
- Ve dnech svozu komunálního odpadu žadatel umožní odvoz komunálního odpadu nebo zajistí umístění odpadních nádob na místo jejich svozu po dohodě se svozovou firmou.
- Stavební práce v chodníku budou prováděny tak, aby byl vždy jeden chodník průchozí bez omezení!!!
- Po celou dobu stavebních prací bude vždy zajištěn rozhled na chodce na přechodech!!!

ZMĚNA PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ K 07. 05. 2024

Název akce: Chomutov, Školní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu			
Zhotovitel: Lama Construction s.r.o.			
Výkres: Přechodné DZ - III. etapa	Měřítko: 1:500	Č. výkresu: 06	Datum: 10/2023

