TŘEBÍZSKÉHO a KUKAŇOVA

protlak
zábor – výkop, výkopek, jednotlivé přípojky, ohraničeno zábranamy
zábrana – chodníková nebo s reflexivním pruhem, i kolem záboru
lávka pro pěší – bezbariérová (před vchody šířka 0.9m, na jiné plochy šířka 1.2m), se zábradlím

nákladní automobil s kontejnerem (2.2m x 6m)
– v průběhu dne se může přesouvat podél výkopu
– z důvodu rychlé nakládky a vykládky
– v případě, že bude technika překážet ve vjezdu nebo výjezdu jiných vozidel, dojde k dočasnému přesunu z pracovního místa tak, aby se uvolnil vjezd nebo výjezd

železný plech pro přejezd osobních vozidel na soukromé pozemky
– v těchto místech se nachází průjezdy do dvorů
– u vjezdu bude vyvěšené oznámení min. 7dní dopředu. Pokud to bude možné, tak s majiteli se projedná postup prací a případná omezení

"chodník uzavřen, přejděte na druhou stranu"

– DZ umístěna 7dní před zahájením prací
– důvod: zemní práce
– E13 – termín od – do, "MIMO VOZIDEL STAVBY"
– před zahájením prací se 7dní dopředu osadní B28+E13. V momentě zahájení prací se B28+E13 posune po jeklu směrem dolů a nad B28 se vloží A15

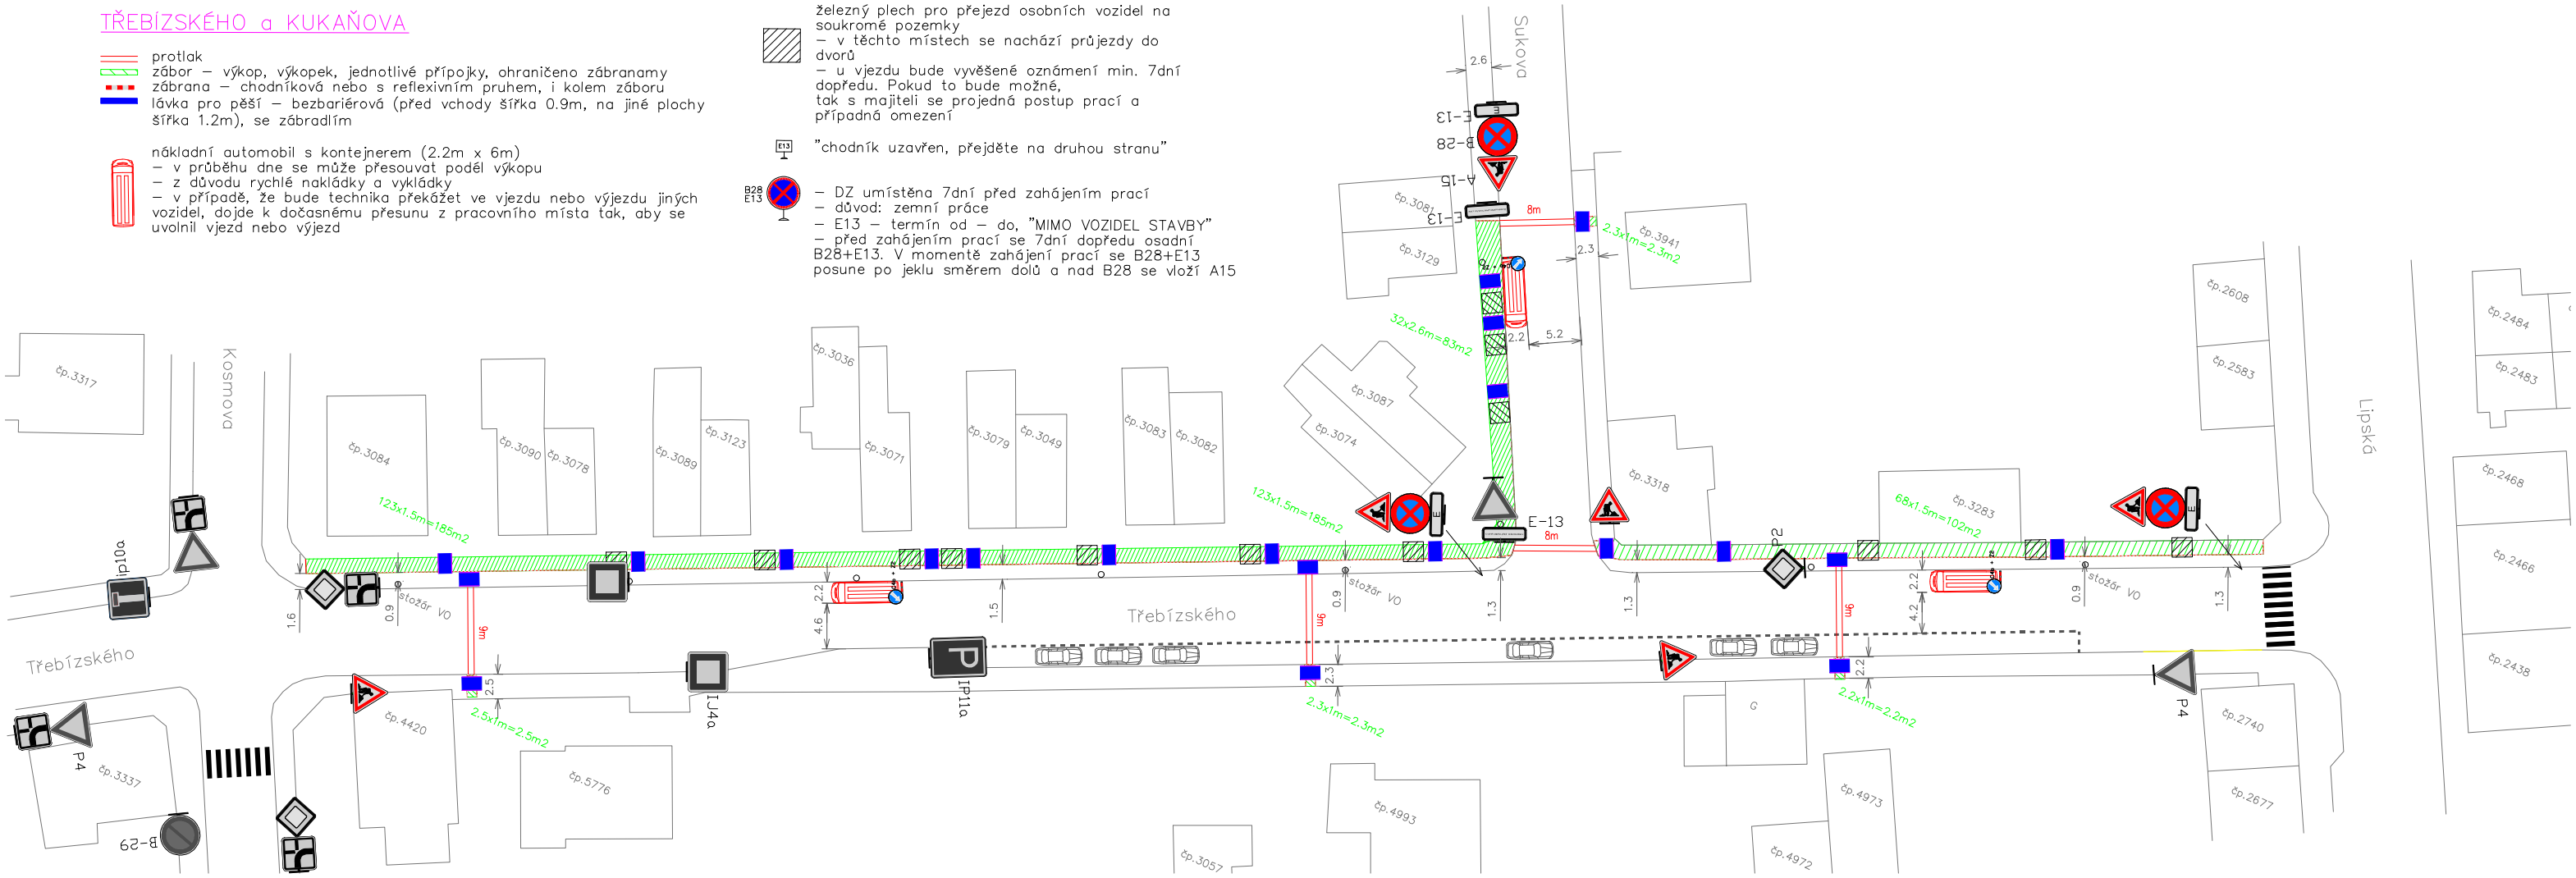

Ing. Vladislav Hrych 02.08.2023 11:07:56

Digitálně podepsal: Ing. Vladislav Hrych
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
