PŘECHODNÉ DZ - 2. ETAPA

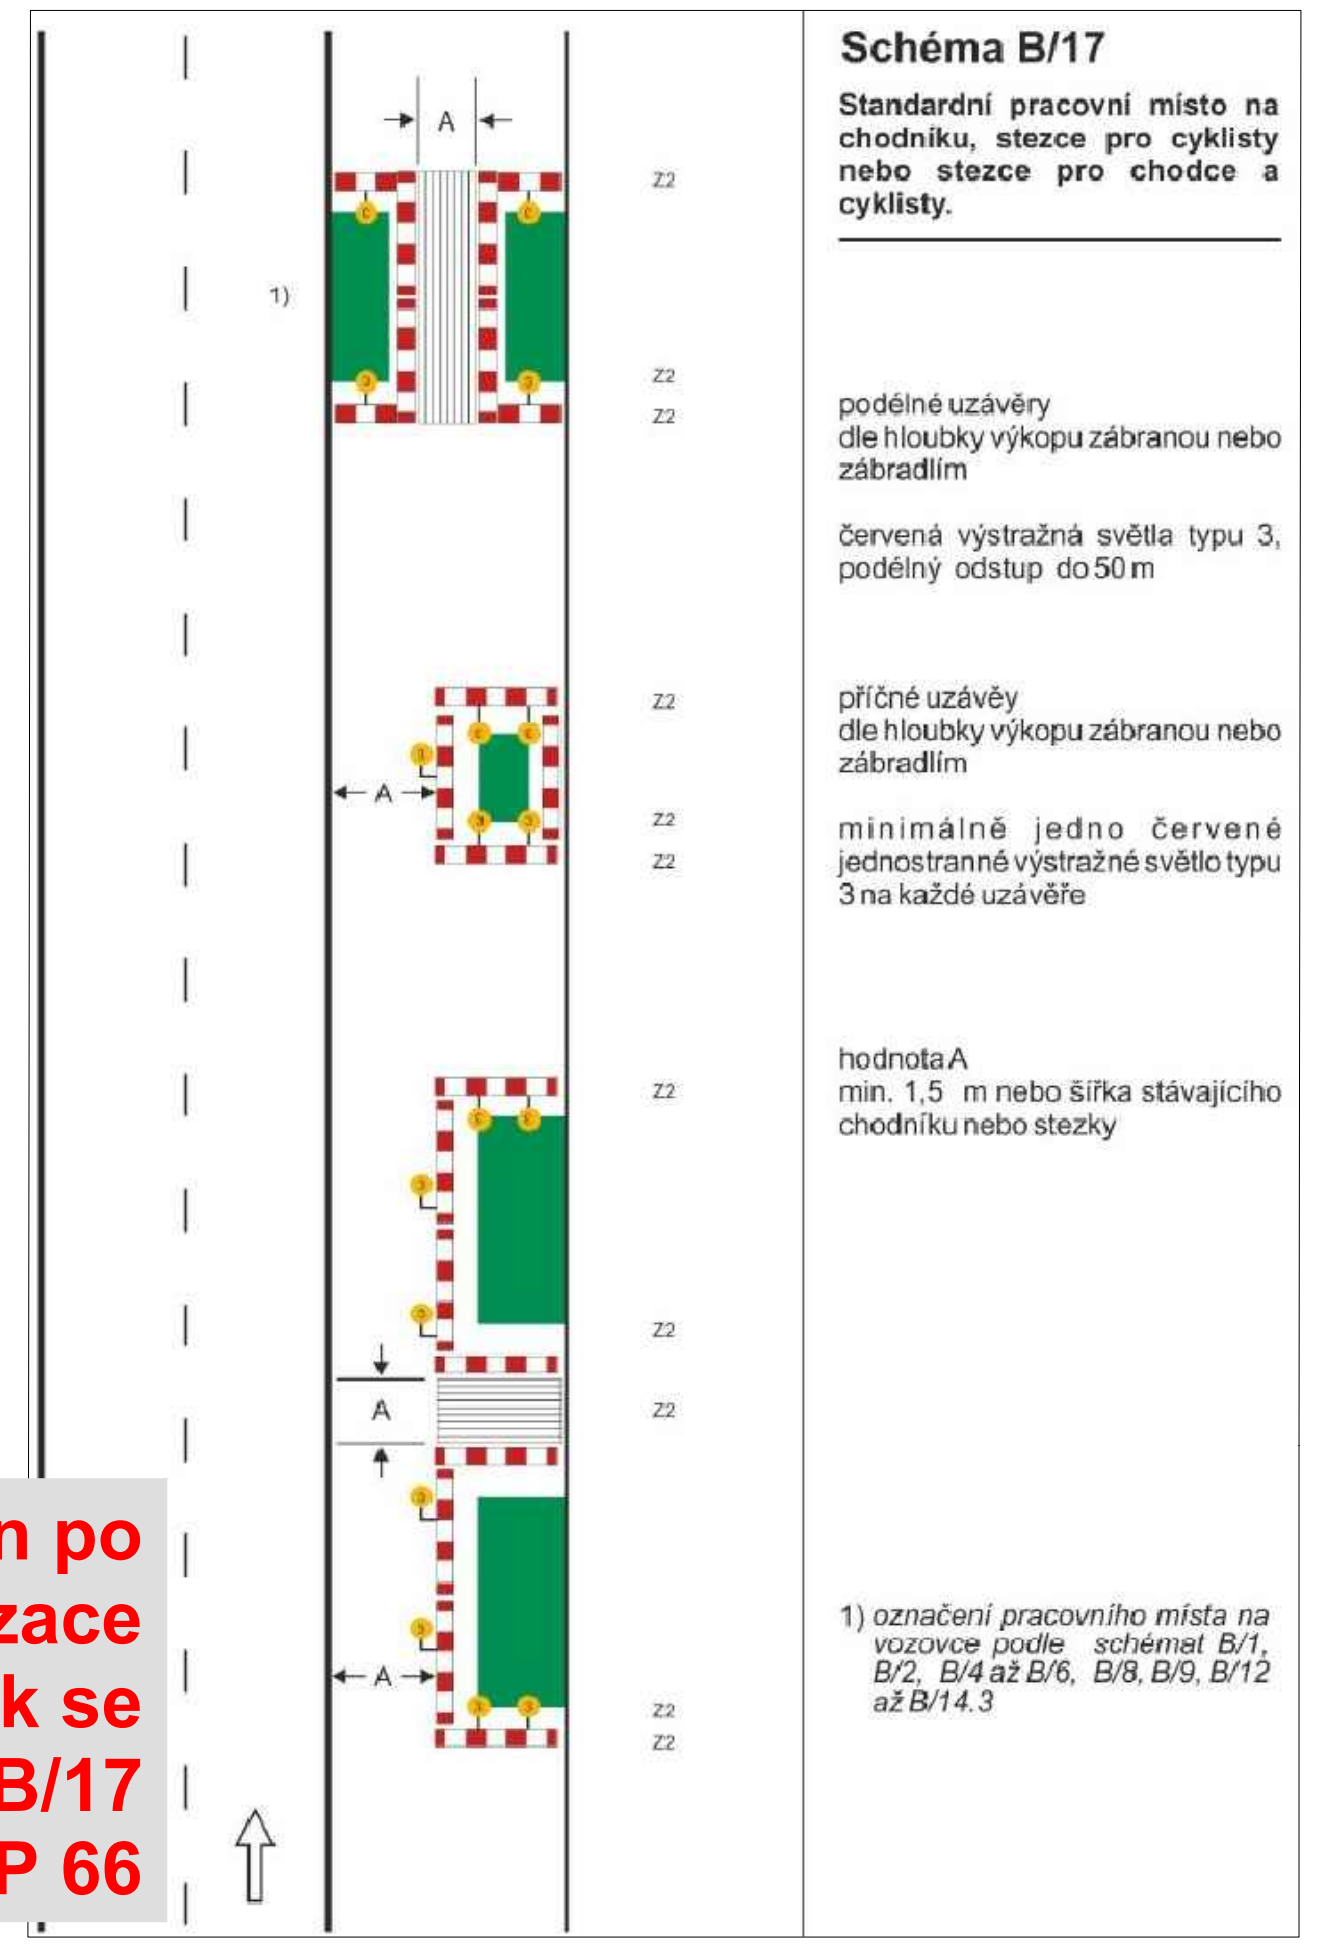

Vstup do objektů zabezpečen po celou dobu realizace prostřednictvím lávek se zabezpečním dle schéma č. B/17 dle TP 66

- ZHOTOVITEL ZAJISTÍ VŠEM NEMOVITOSTEM DOTČENÝM STAVBOU BEZPEČNÝ A BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP K NEMOVITOSTEM!!!
- REŽIM PŘÍSTUPU K JEDNOTLIVÝM NEMOVITOSTEM BUDE ZHOTOVITELEM DOHODNUT INDIVIDUÁLNĚ S KAŽDOU NEMOVITOSTÍ ZVLÁŠŤ!!!

Legenda obrysy, hranice:

- Stávající polohopis
- Výkop NTL plynovod
- Pracovní místo
- IP19 Stávající dopravní značení
- A15 Přechodné dopravní značení
- B28 Přechodné dopravní značení osazené v min. týdenním předstihu
- Lávka pro pěší

Poznámky:

- Jakékoli nesrovnalosti konzultovat s projektantem!!!
- Veškerá pracovní místa na komunikaci budou označena dle TP 66, případně TP 65 a TP 133!!
- Prostor zvláštního užívání bude zhotovitelem oplocen!

- Po zásypu výkopu a jeho zhutnění, budou komunikace udržovány, do doby provedení finální úpravy povrchu, v provizorním a provozuschopném stavu.
- Veškeré dopravní značení bude pravidelně kontrolováno!!!
- DZ bude udržováno v čistém (čitelném) stavu a bude kontrolováno správné umístění a nasměrování DZ!!!
- DZ bude umístěno tak, aby nebránilo volnému průchodu, neomezovalo rozhled v křižovatkách, nebránilo volnému přístupu do domů a nezakrývalo DZ!
- Uživatelům sousedních nemovitostí bude umožněn přístup k nemovitostem. Žadatel zajistí dostatečným a prokazatelným způsobem informovanost všech občanů dotčených zvláštním užíváním, rovněž bude dohodnut režim přístupu k jednotlivým nemovitostem v úseku stavby.
- Ve dnech svozu komunálního odpadu žadatel umožní odvoz komunálního odpadu nebo zajistí umístění odpadních nádob na místo jejich svozu po dohodě se svozovou firmou.
- Po celou dobu stavebních prací bude vždy zajištěn rozhled na chodce na přechodech!!!
- Na všech vstupech do staveniště bude osazeno DZ E13 s textem "POZOR, PROCHÁZÍTE STAVBOU!"
- V době výkopu v chodníku bude na začátku chodníku osazeno DZ E13 s textem "CHODNÍK UZAVŘEN!", poté bude průchod zajištěn prostřednictvím lávek se zabezpečením dle schéma č. B/17 dle TP 66.
- Zhotovitel bude mít k dispozici přejezdové plechy pro potřebu zásahu vozidel IZS.

Název akce:				
REKO MS Chomutov - Na Moráni + 1			2. část	[redacted]
Zhotovitel:				
PLYNOMONT TEPLICE, s.r.o.				
Výkres:	Měřítko:	Č. výkresu:	Datum:	
Přechodné DZ - 2. etapa	1:500	05	04/2026	
